
Activity ID	Activity Name	Planned Duration	Remaining Duration	Schedule % Complete	Start	Finish	Total Float
CM 1 Base CM2025		333	333	0%	06-Nov-25	16-Feb-27	0
1000	Indirect costs	333	333	0%	06-Nov-25	15-Feb-27	0
BEGINNING	Beginning of Project	0	0	0%	06-Nov-25		0
END	End of Project	0	0	0%		16-Feb-27	0
CM 1 Base.CSW Construction		1	1	0%	06-Nov-25	06-Nov-25	0
CM 1 Base.CSW_00.04.01.00 Excavat		1	1	0%	06-Nov-25	06-Nov-25	0
A1010	Clearing Leveling + Excavat	1	1	0%	06-Nov-25	06-Nov-25	0
CM 1 Base.STR Structural Wo		191	191	0%	07-Nov-25	31-Jul-26	0
CM 1 Base.STR_01.01 Foundation S		47	47	0%	07-Nov-25	12-Jan-26	9
A1020	Elevator Pit Foundation blin	1	1	0%	07-Nov-25	07-Nov-25	0
A1030	Concrete pouring for elevat	1	1	0%	10-Nov-25	10-Nov-25	0
A1040	Concrete Pouring for Elevat	1	1	0%	11-Nov-25	11-Nov-25	0
A1050	Continious Footing Foundat	1	1	0%	12-Nov-25	12-Nov-25	0
A1060	Concrete Pouring for Contir	6	6	0%	13-Nov-25	20-Nov-25	0
A1070	Foundation backfilling	1	1	0%	12-Jan-26	12-Jan-26	9
CM 1 Base.STR_01.02 Ground Floor		69	69	0%	21-Nov-25	25-Feb-26	9
A1100	Concrete Pouring for GF Cc	20	20	0%	21-Nov-25	19-Dec-25	0
A1110	Concrete Pouring for GF Sh	12	12	0%	22-Dec-25	09-Jan-26	0
A1120	Concrete Pouring for GF Ele	3	3	0%	12-Jan-26	14-Jan-26	0
A1130	Concrete Pouring for GF Sti	7	7	0%	15-Jan-26	23-Jan-26	0
A1140	Concrete Pouring for GF Be	3	3	0%	15-Jan-26	19-Jan-26	4
A1150	Concrete Filling for 1F Slab	23	23	0%	26-Jan-26	25-Feb-26	0
CM 1 Base.STR_01.03 First Floor Str		60	60	0%	26-Feb-26	20-May-26	0
A1160	Concrete Pouring for 1F Co	16	16	0%	26-Feb-26	19-Mar-26	0
A1170	Concrete Pouring for 1F Sh	6	6	0%	20-Mar-26	27-Mar-26	0
A1180	Concrete Pouring for 1F Ele	3	3	0%	30-Mar-26	01-Apr-26	0
A1190	Concrete Pouring for 1F Sti	5	5	0%	02-Apr-26	08-Apr-26	0
A1200	2F Concrete Floor Slab Fille	30	30	0%	09-Apr-26	20-May-26	0
CM 1 Base.STR_01.04 Second Floor		49	49	0%	21-May-26	28-Jul-26	9
A1210	Concrete Pouring for 2F Co	17	17	0%	21-May-26	12-Jun-26	0
A1220	Concrete Pouring for 2F Ele	2	2	0%	15-Jun-26	16-Jun-26	0
A1230	Concrete Pouring for Balcor	2	2	0%	17-Jun-26	18-Jun-26	0
A1240	Roof Slab Concrete Filling	28	28	0%	19-Jun-26	28-Jul-26	0
CM 1 Base.STR_01.05 Roof Structur		3	3	0%	29-Jul-26	31-Jul-26	0
A1250	Concrete Pouring for Roof I	3	3	0%	29-Jul-26	31-Jul-26	0
A1260	Concrete Pouring for Shaft	1	1	0%	29-Jul-26	29-Jul-26	2
CM 1 Base.ARCH Architecture		141	141	0%	03-Aug-26	15-Feb-27	0
CM 1 Base.ARCH_01.01 External Str		141	141	0%	03-Aug-26	15-Feb-27	0
A1320	External Masonry	27	27	0%	03-Aug-26	08-Sep-26	0
A1340	External Insulation	3	3	0%	08-Oct-26	12-Oct-26	0
A1360	External Plastering	31	31	0%	25-Nov-26	07-Jan-27	17
A1370	External Painting Finishes	10	10	0%	02-Feb-27	15-Feb-27	0
CM 1 Base.ARCH_01.03 Roof Work		3	3	0%	13-Oct-26	15-Oct-26	46
A1680	Roof floor insulation	1	1	0%	13-Oct-26	13-Oct-26	0
A1690	Roof floor screeding	1	1	0%	14-Oct-26	14-Oct-26	46
A1710	Roof floor waterproffing barr	1	1	0%	15-Oct-26	15-Oct-26	46
CM 1 Base.ARCH_01.05 Internal Part		56	56	0%	14-Sep-26	30-Nov-26	14
A1330	GF Internal masonry	3	3	0%	14-Sep-26	16-Sep-26	0
A1350	GF Plaster	16	16	0%	17-Sep-26	08-Oct-26	0
A1840	GF Electrical	1	1	0%	09-Oct-26	09-Oct-26	0
A1850	GF Mechanical + Plumbing	1	1	0%	12-Oct-26	12-Oct-26	0
A1860	GF Internal Wall Insulation	1	1	0%	14-Oct-26	14-Oct-26	0
A1870	1F Internal masonry	3	3	0%	17-Sep-26	21-Sep-26	27
A2010	1F Plaster	18	18	0%	09-Oct-26	03-Nov-26	14
A2170	1F Electrical	1	1	0%	03-Nov-26	04-Nov-26	28
A2180	1F Mechanical + Plumbing	1	1	0%	04-Nov-26	05-Nov-26	28
A2190	1F Internal Wall Insulation	2	2	0%	05-Nov-26	09-Nov-26	28
A2230	2F Internal masonry	4	4	0%	22-Sep-26	25-Sep-26	41
A2240	2F Plaster	16	16	0%	04-Nov-26	25-Nov-26	14
A2250	2F Electrical	1	1	0%	25-Nov-26	26-Nov-26	14
A2260	2F Mechanical + Plumbing	1	1	0%	26-Nov-26	27-Nov-26	14
A2270	2F Internal Wall Insulation	1	1	0%	27-Nov-26	30-Nov-26	14
CM 1 Base.ARCH_01.02 Floor Work		92	92	0%	09-Sep-26	14-Jan-27	0
A1080	GF Concrete Filling with Igloc	3	3	0%	09-Sep-26	11-Sep-26	0
A1090	GF Concrete Low Density S	1	1	0%	13-Oct-26	13-Oct-26	0
A1390	GF Floor insulation	3	3	0%	16-Nov-26	18-Nov-26	0
A1470	GF Floor screed	1	1	0%	19-Nov-26	19-Nov-26	0
A1480	1F Floor screed	1	1	0%	20-Nov-26	20-Nov-26	14
A1490	2F Floor Insulation	1	1	0%	19-Nov-26	19-Nov-26	27
A1570	2F Floor screed	2	2	0%	23-Nov-26	24-Nov-26	26
A1580	Terrace Floor insulation	1	1	0%	20-Nov-26	20-Nov-26	34
A1890	Terrace Floor screed	1	1	0%	25-Nov-26	25-Nov-26	32
A2000	GF Floor finishes	14	14	0%	20-Nov-26	09-Dec-26	0
A2020	GF Stair finishes	1	1	0%	10-Dec-26	10-Dec-26	0
A2040	1F Floor finishes	13	13	0%	11-Dec-26	29-Dec-26	0
A2050	1F Stair fishes	1	1	0%	30-Dec-26	30-Dec-26	0
A2080	2F Floor fishes	11	11	0%	31-Dec-26	14-Jan-27	0
A2210	Terrace finishes	4	4	0%	11-Jan-27	14-Jan-27	0
CM 1 Base.ARCH_01.07 Internal Fini		43	43	0%	15-Oct-26	14-Dec-26	41
A1590	GF Wall plasterboard	10	10	0%	15-Oct-26	28-Oct-26	0
A1910	GF Ceiling plasterboard	9	9	0%	29-Oct-26	10-Nov-26	0
A1960	1F Wall plasterboard	18	18	0%	09-Nov-26	03-Dec-26	41
A1970	1F Ceiling plasterboard	7	7	0%	03-Dec-26	14-Dec-26	41
A1980	2F Wall plasterboard	4	4	0%	30-Nov-26	04-Dec-26	14
A1990	2F Ceiling plasterboard	1	1	0%	04-Dec-26	07-Dec-26	14
CM 1 Base.ARCH_01.06 Windows ar		28	28	0%	11-Nov-26	16-Dec-26	41
A1900	GF Installation of Subframe	1	1	0%	11-Nov-26	11-Nov-26	0
A1930	GF Installation of Windows	2	2	0%	12-Nov-26	13-Nov-26	0
A1940	GF Installation of External D	1	1	0%	12-Nov-26	12-Nov-26	67
A2380	1F Installation of Subframe	1	1	0%	14-Dec-26	15-Dec-26	41
A2390	1F Installation of Windows a	3	3	0%	15-Dec-26	16-Dec-26	41
A2400	2F Installation of Subframe	1	1	0%	07-Dec-26	08-Dec-26	14
A2410	2F Installation of Windows a	2	2	0%	08-Dec-26	10-Dec-26	14
CM 1 Base.Finishing + 2MEP I		37	37	0%	11-Dec-26	01-Feb-27	10
CM 1 Base.Finishing + 2MEP.GF GF		34	34	0%	11-Dec-26	27-Jan-27	13
A1270	GF Painting	7	7	0%	11-Dec-26	21-Dec-26	21
A1271	GF Railing	1	1	0%	22-Dec-26	22-Dec-26	39
A1280	GF 2nd Phase of Electricity	1	1	0%	22-Dec-26	22-Dec-26	21
A2090	GF 2nd Phase Mechanical&	1	1	0%	23-Dec-26	23-Dec-26	21
A2100	GF Elevator Finishing	1	1	0%	24-Dec-26	24-Dec-26	21
A2110	GF Internal Doors	1	1	0%	27-Jan-27	27-Jan-27	0
CM 1 Base.Finishing + 2MEP.1F 1F Ir		22	22	0%	31-Dec-26	29-Jan-27	11
A2280	1F Painting	9	9	0%	31-Dec-26	12-Jan-27	6
A2281	1F Railing	1	1	0%	13-Jan-27	13-Jan-27	23
A2290	1F 2nd Phase of Electricity	1	1	0%	13-Jan-27	13-Jan-27	6
A2300	1F 2nd Phase Mechanical&	1	1	0%	14-Jan-27	14-Jan-27	6
A2310	1F Elevator Finishing	1	1	0%	15-Jan-27	15-Jan-27	6
A2320	1F Internal Doors	2	2	0%	28-Jan-27	29-Jan-27	0
CM 1 Base.Finishing + 2MEP.2F 2F Ir		12	12	0%	15-Jan-27	01-Feb-27	9
A2330	2F Painting	5	5	0%	15-Jan-27	21-Jan-27	0
A2340	2F 2nd Phase of Electricity	1	1	0%	22-Jan-27	22-Jan-27	0
A2350	2F 2nd Phase Mechanical&	1	1	0%	25-Jan-27	25-Jan-27	0
A2360	2F Elevator Finishing	1	1	0%	26-Jan-27	26-Jan-27	0
A2370	2F Internal Doors	1	1	0%	01-Feb-27	01-Feb-27	0
CMVersion 2 GR4 CM2025		181	181	0%	09-Nov-25	16-Jul-26	0

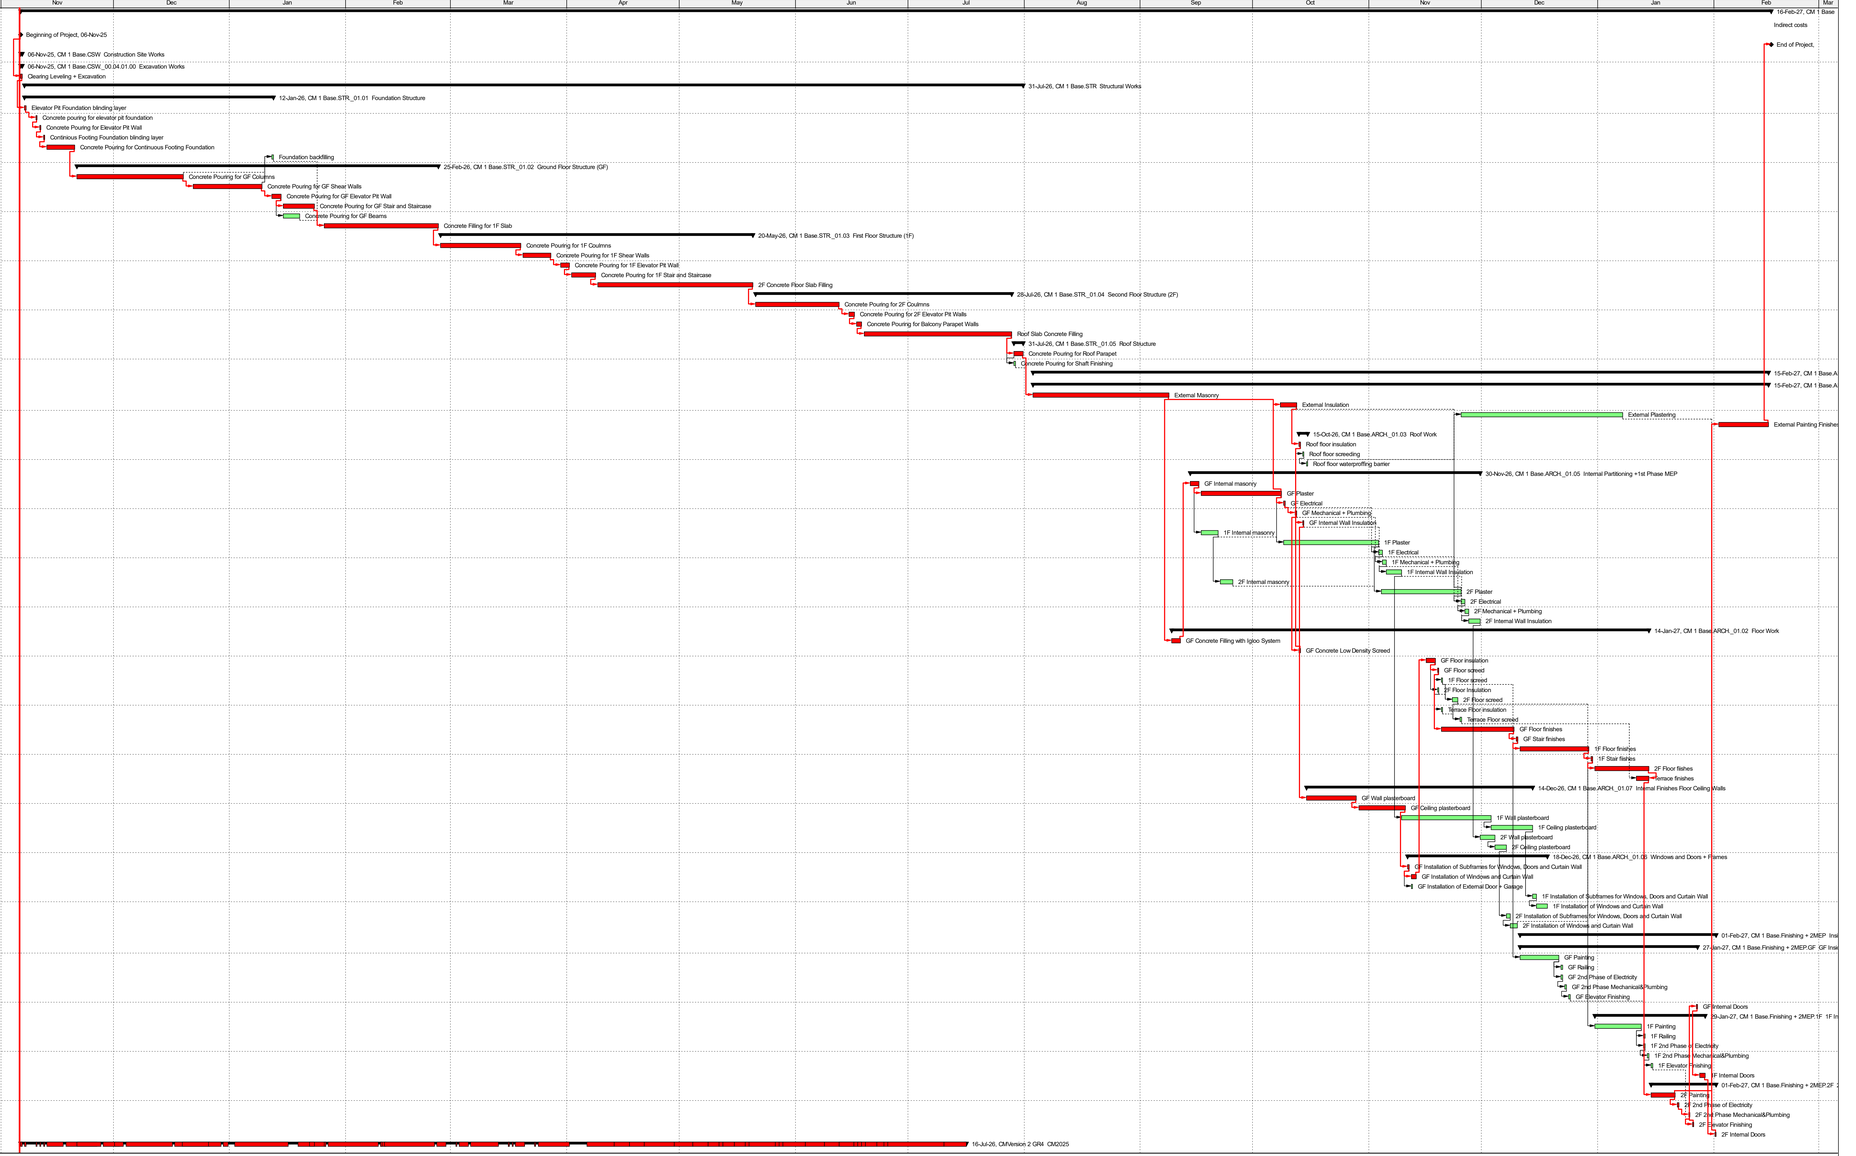

© Oracle Corporation
