
Activity ID	Activity Name	Planned Duration	Remaining Duration	Schedule % Complete	Start	Finish	Total Float
Project: CM_CM2025		718	718	0%	06-Nov-25	07-Aug-28	-696
WBS: CM.CSW_Construction S		2	2	0%	06-Nov-25	07-Nov-25	20
A1880	Beginning of Project	0	0	0%	06-Nov-25		22
WBS: CM.CSW_00.04.01.00_Excavati		2	2	0%	06-Nov-25	07-Nov-25	-636
A1010	Clearing Leveling + Excavat	2	2	0%	06-Nov-25	07-Nov-25	-636
WBS: CM.STR_Structural Wor		503	503	0%	07-Nov-25	12-Oct-27	-482
WBS: CM.STR_01.01_Foundations St		84	84	0%	07-Nov-25	04-Mar-26	-63
A1020	Elevator Pit Foundation blin	1	1	0%	07-Nov-25*	07-Nov-25	-635
A1030	Concrete pouring for elevat	1	1	0%	10-Nov-25*	10-Nov-25	3
A1040	Continuous Footing Founda	1	1	0%	10-Nov-25*	10-Nov-25	-636
A1050	Concrete Pouring for Contir	13	13	0%	11-Nov-25*	27-Nov-25	-636
A1060	Concrete Pouring for Elevat	1	1	0%	13-Nov-25*	13-Nov-25	3
A1070	Foundation backfilling	6	6	0%	25-Feb-26*	04-Mar-26	-63
WBS: CM.STR_01.02_Ground Floor S		223	223	0%	12-Dec-25	20-Oct-26	-227
A1100	Concrete Pouring for GF Co	103	103	0%	12-Dec-25*	05-May-26	-650
A1110	Concrete Pouring for GF Ele	7	7	0%	12-Dec-25*	22-Dec-25	-55
A1120	Concrete Pouring for GF Sla	16	16	0%	30-Jan-26*	20-Feb-26	-55
A1130	Concrete Pouring for GF Sh	148	148	0%	12-Dec-25*	07-Jul-26	-547
A1140	Concrete Pouring for GF Be	63	63	0%	07-Jul-26*	01-Oct-26	-694
A1150	Concrete Filling for 1F Slab	13	13	0%	02-Oct-26	20-Oct-26	-694
WBS: CM.STR_01.03_First Floor Stru		113	113	0%	21-Oct-26	26-Mar-27	-343
A1160	Concrete Pouring for 1F Co	82	82	0%	21-Oct-26	11-Feb-27	-694
A1170	Concrete Pouring for 1F Ele	3	3	0%	21-Oct-26	23-Oct-26	-244
A1180	Concrete Pouring for 1F Sta	11	11	0%	26-Oct-26	09-Nov-26	-244
A1190	Concrete Pouring for 1F Sh	31	31	0%	12-Feb-27	26-Mar-27	-694
WBS: CM.STR_01.04_Second Floor		104	104	0%	29-Mar-27	19-Aug-27	-447
A1200	2F Concrete Floor Slab Fille	17	17	0%	29-Mar-27	20-Apr-27	-694
A1210	Concrete Pouring for 2F Co	87	87	0%	21-Apr-27	19-Aug-27	-694
A1220	Concrete Pouring for 2F Ele	3	3	0%	21-Apr-27	23-Apr-27	-360
A1230	Concrete Pouring for Balcor	45	45	0%	21-Apr-27	22-Jun-27	-402
WBS: CM.STR_01.05_Roof Structure		58	58	0%	23-Jul-27	12-Oct-27	-482
A1240	Roof Slab Concrete Filling	16	16	0%	23-Jul-27	13-Aug-27	-694
A1250	Concrete Pouring for Roof F	42	42	0%	16-Aug-27	12-Oct-27	-694
A1260	Concrete Pouring for Shaft	10	10	0%	16-Aug-27	27-Aug-27	-450
**WBS: CM.ARCH_Architecture **		214	214	0%	13-Oct-27	07-Aug-28	-696
WBS: CM.ARCH_01.01_Architectural		41	41	0%	13-Oct-27	08-Dec-27	-532
A1320	External Masonry	27	27	0%	13-Oct-27*	18-Nov-27	-694
A1360	External Insulation	4	4	0%	19-Nov-27*	24-Nov-27	-532
A1370	External Finishes	10	10	0%	25-Nov-27*	08-Dec-27	-532
WBS: CM.ARCH_01.02_Ground Floo		77	77	0%	19-Nov-27	06-Mar-28	-586
A1400	Flooring GF	9	9	0%	09-Dec-27*	21-Dec-27	-532
A1410	Internal Partitions GF	46	46	0%	19-Nov-27*	21-Jan-28	-694
A1420	Ceiling GF	3	3	0%	24-Jan-28*	26-Jan-28	-558
A1430	Doors and windows installat	11	11	0%	24-Jan-28*	07-Feb-28	-694
A1440	Flooring GF (Finishing))	14	14	0%	08-Feb-28*	25-Feb-28	-694
A1450	Finishing works stair GF	3	3	0%	28-Feb-28*	01-Mar-28	-694
A1460	Internal painting GF	3	3	0%	02-Mar-28*	06-Mar-28	-586
WBS: CM.ARCH_01.03_First Floor A		69	69	0%	02-Mar-28	06-Jun-28	-642
A1500	Flooring FF	1	1	0%	02-Mar-28*	02-Mar-28	-694
A1510	Internal wall partition FF	30	30	0%	03-Mar-28*	13-Apr-28	-694
A1520	Ceiling FF	7	7	0%	14-Apr-28*	24-Apr-28	-694
A1530	Door and windows installati	6	6	0%	25-Apr-28*	02-May-28	-694
A1540	Flooring FF (Finishing))	13	13	0%	03-May-28*	19-May-28	-694
A1550	Finishing works stair FF	2	2	0%	22-May-28*	23-May-28	-694
A1560	Internal painting FF	11	11	0%	23-May-28*	06-Jun-28	-616
WBS: CM.ARCH_01.04_Second Floo		52	52	0%	24-May-28	03-Aug-28	-694
A1600	Flooring 2F	2	2	0%	24-May-28*	25-May-28	-694
A1610	Internal wall partition 2F	17	17	0%	26-May-28*	19-Jun-28	-694
A1620	Ceiling 2F	1	1	0%	20-Jun-28*	20-Jun-28	-694
A1630	Door and windows installati	10	10	0%	21-Jun-28*	04-Jul-28	-694
A1640	Flooring 2F (Finishing)	11	11	0%	05-Jul-28*	19-Jul-28	-694
A1650	Internal painting 2F	11	11	0%	20-Jul-28*	03-Aug-28	-694
WBS: CM.ARCH_01.05_Roof Architec		3	3	0%	03-Aug-28	07-Aug-28	-696
A1700	Flooring Roof	3	3	0%	03-Aug-28*	07-Aug-28	-696
WBS: CM.MEP_Mechanical Ele		695	695	0%	06-Nov-25	05-Jul-28	-679
WBS: CM.MEP_01.01_Electrical Syst		12	12	0%	20-Jun-28	05-Jul-28	-677
A1270	Installation of First Phase o	1	1	0%	20-Jun-28*	20-Jun-28	-666
A1280	Installation of Second Phas	1	1	0%	05-Jul-28	05-Jul-28	-677
WBS: CM.MEP_01.02_Mechanical an		12	12	0%	20-Jun-28	05-Jul-28	-679
A1290	Installation of First Phase M	2	2	0%	20-Jun-28	21-Jun-28	-671
A1300	Installation of Second Phas	1	1	0%	05-Jul-28	05-Jul-28	-679
WBS: CM.MEP_01.03_Elevator Finis		1	1	0%	06-Nov-25	06-Nov-25	17
A1310	Installation of Elevator	1	1	0%	06-Nov-25	06-Nov-25	17
Project: L1-1 Base_Office		462	462	0%	28-Oct-26	05-Aug-26	0
Project: EC00515_City Center O		694	567	16.67%	01-Nov-10 A	23-Jul-13	0
Project: CM 1 Base_CM2025		333	333	0%	06-Nov-25	16-Feb-27	0

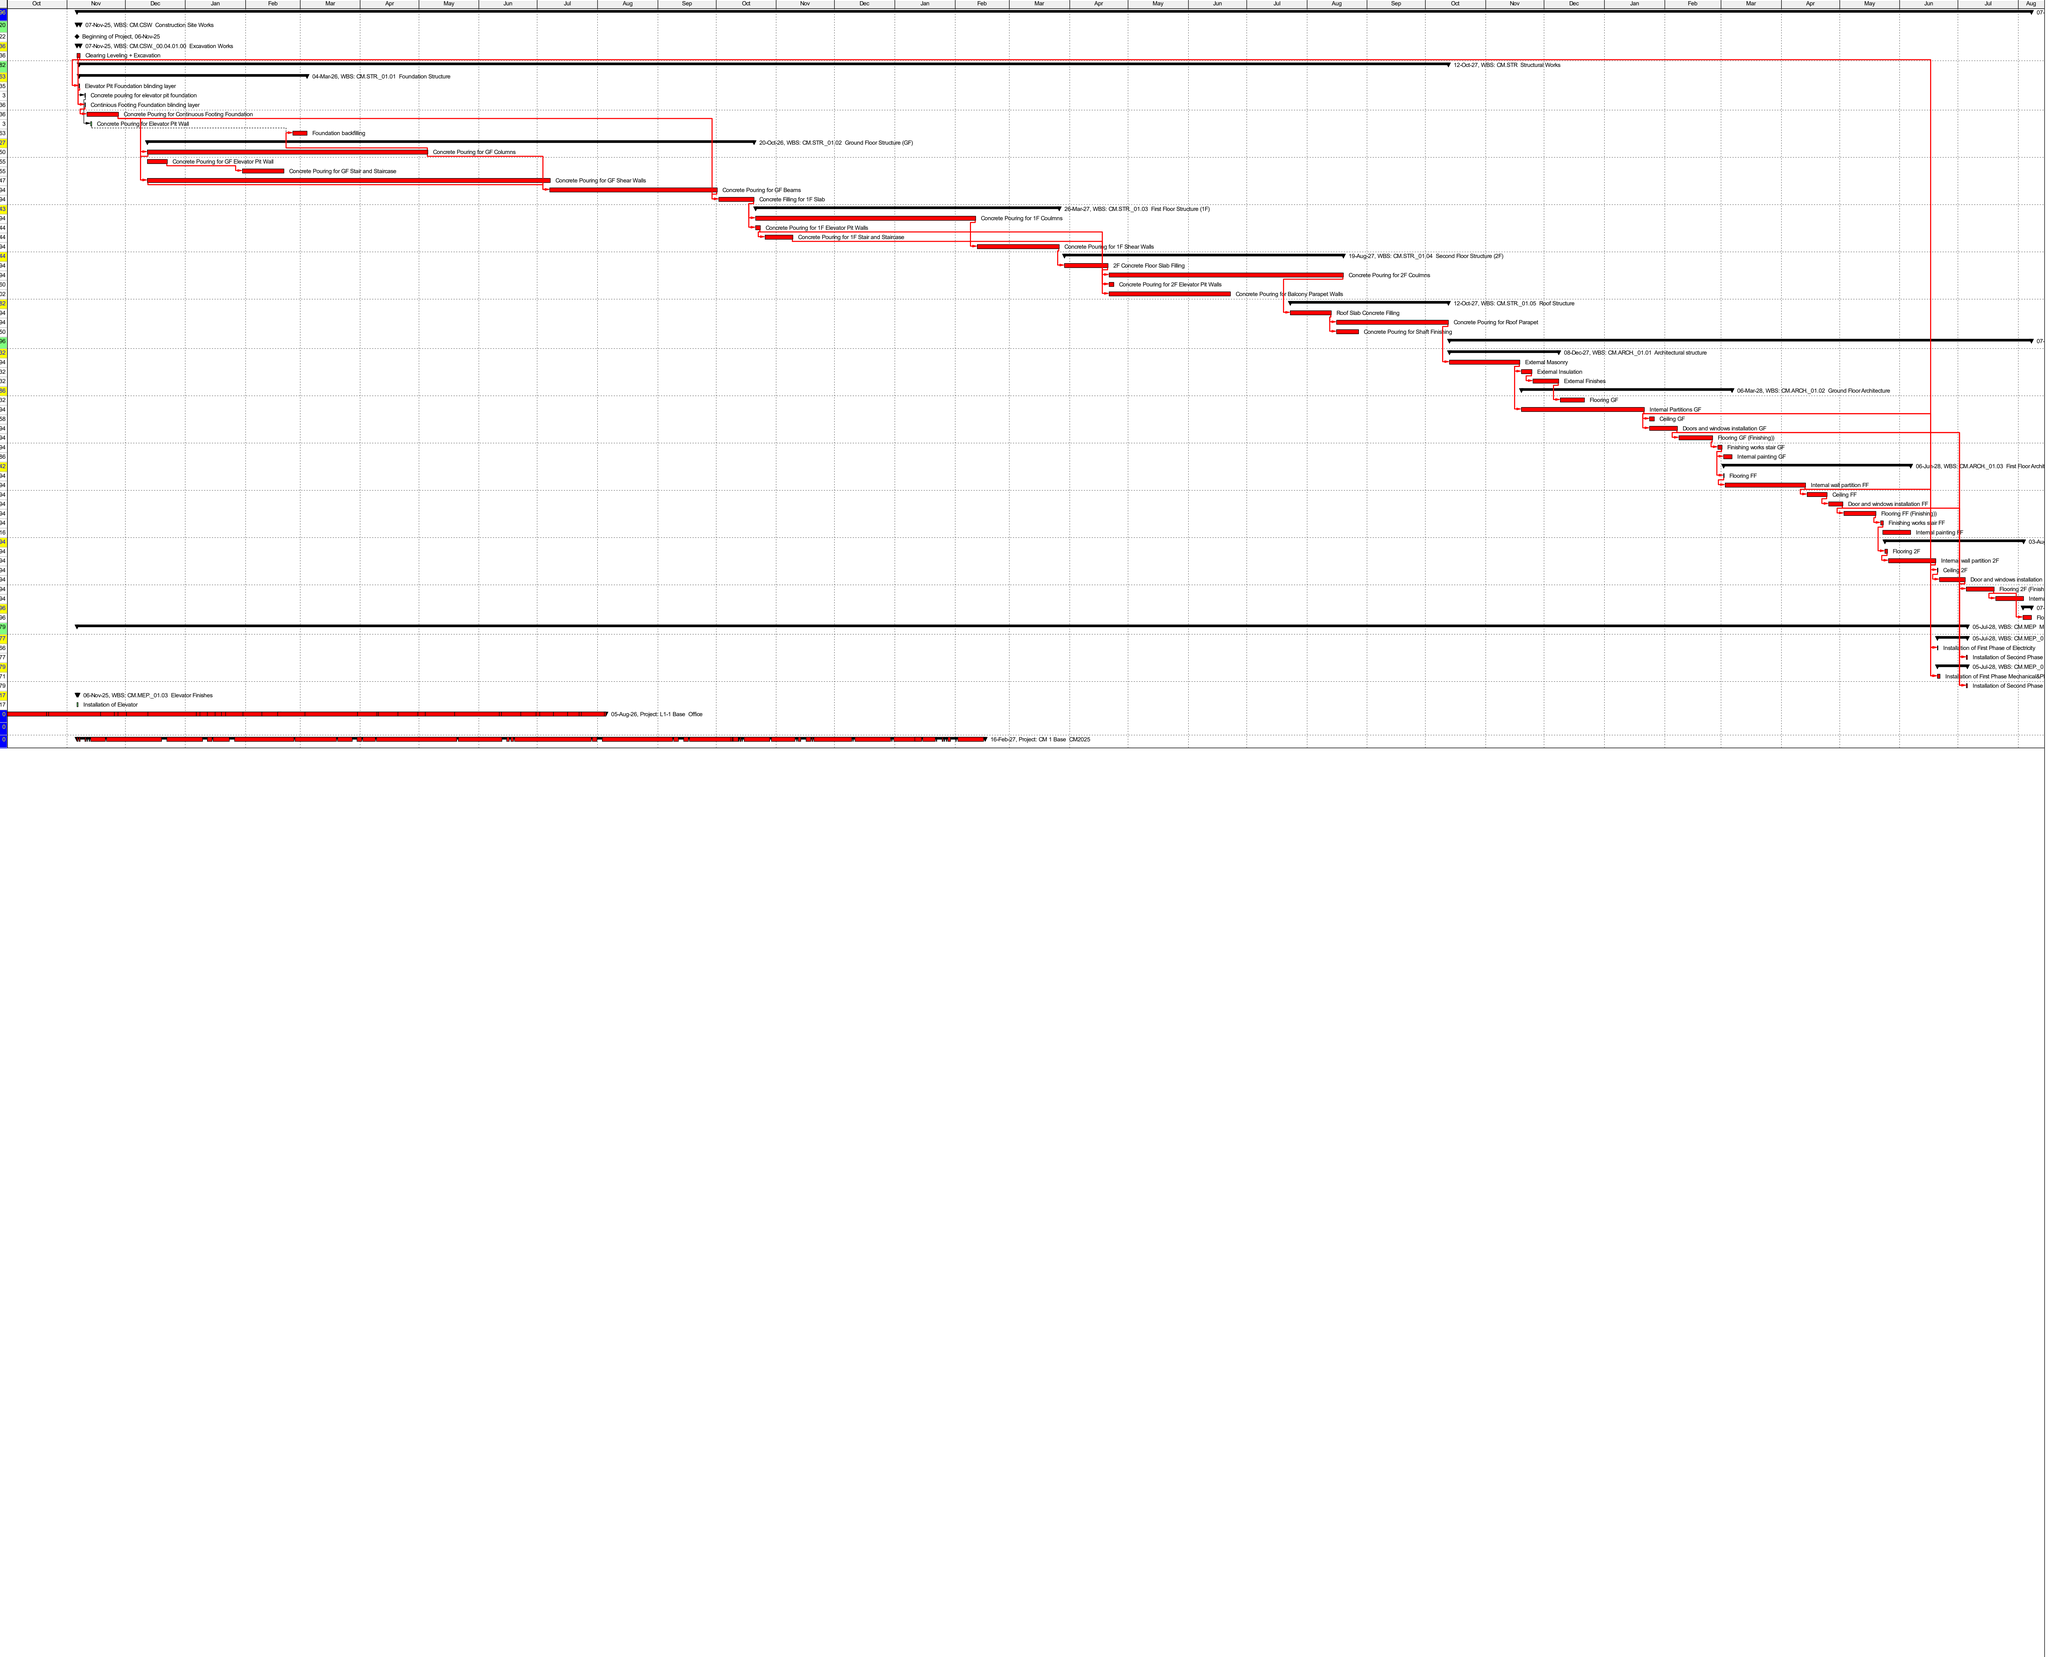

© Oracle Corporation
